


Коммерческое предложение

29 мая 2022 г.

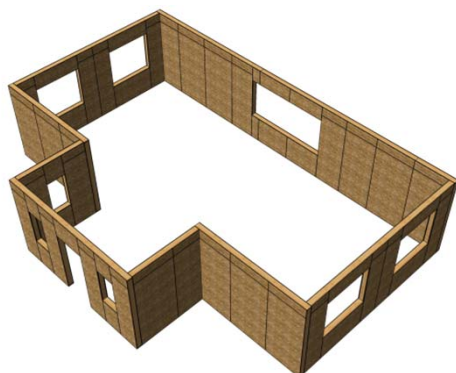

Республика Казахстан, г. Талгар
ул. Рыскулова 189А
мобильный: +7 700 283 5464
e-mail: info@fasthome.kz
сайт: www.fasthome.kz

Общие данные

Заказчик: г. Талдыкорган

Домокомплект из СИП-панелей 174 мм (ОСП+ОСП) 2 500 мм - **32 панели**, высота стен **2 806 мм**

Пятно застройки - **81,84 кв.м**

Объём и вес домокомплекта

Наименование материалов	Объём (куб.м)	Вес 1 куб.м	Общий вес (кг)
СИП-панели 174 мм (ОСП+ОСП) - 81 деталь	16.20	90.00	1 458
Деревянные детали (стойки, контур, проёмы)	1.80	520	936
Итого:	18.00		2 394

Сводная спецификация

Материалы для изготовления домокомплекта

Название	Колич.	Ед.изм.	Цена	Стоимость
Гвозди для сборки стоек (2,5х40)	1552.00	шт	3	4 656
Гвозди для сборки стоек (2,8х70)	582.00	шт	5	2 910
Доски 36х130х6000 (для СИП-стоек)	36.00	палок	3 865	139 140
Доски 38х148х6000 (для СИП-контура)	24.00	палок	5 500	132 000
Доски 38х148х6000 (для СИП-проёмов)	5.00	палок	5 500	27 500
Клей PURTIS, 30 кг (для СИП-панелей)	3.00	уп	96 000	288 000
ОСП-3, 12 мм, 2500х1250, 3,125 кв.м (для СИП-панелей)	64.00	лист	7 200	460 800
Огнебиозащита "ТУТАН" (10 л)	5.00	уп	4 700	23 500
ППС-11, 150 мм, 4,54 куб.м (для СИП-панелей)	4.00	блок	93 945	375 780
Фанера берёзовая - 9 мм (2440х1220) 2,98 кв.м, 2/3 (для стоек)	6.00	лист	13 600	81 600
Шурупы для сборки стоек (5х80)	582.00	шт	17	9 894
Итого по материалам:				1 545 780

Работа по изготовлению домокомплекта

Название	Колич.	Ед.изм.	Цена	Стоимость
Изготовление домокомплекта	1.00	компл.		426 400
Чертежи для монтажа в электронном виде в формате PDF	111.00	кв.м	250	27 750
Итого по изготовлению домокомплекта:				454 150

Всего по материалам	1 545 780
Всего по изготовлению домокомплекта	454 150
Всего за домокомплект	1 999 930

Коммерческое предложение действительно по 1 июня 2022 года включительно
